INFORME DE VALORIZACIÓN DE OBRA N.° 03

Periodo: Julio 2026

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA

Suma alzada
Estado: Presentada
Ley N.° 32069

Valorización bruta del mes (A)	Reajuste	Total a facturar	Avance físico acumulado
S/ 90,536.60	**S/ 3,078.24**	**S/ 85,952.12**	**45.97 %**
sin IGV	K = 1.034	incluye IGV 18 %	mes: 19.01 % · ejec./prog. 82.09 %

1. Datos del contrato

Obra	Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. N.° 10999 (EJEMPLO)		
Entidad	Municipalidad Provincial de Chota	**Contrato**	N.° 015-2026-MPCH
Contratista	Constructora Ejemplo S.A.C.	**Supervisor / inspector**	Consorcio Supervisor Ejemplo
Residente de obra	Ing. Residente de Ejemplo	**Ubicación**	Anguía - Chota - Cajamarca
CUI	2599999	**Régimen / sistema**	Ley N.° 32069 – Ley General de Contrataciones Públicas · Suma alzada
Inicio del plazo / plazo	04/05/2026 · 150 días calendario	**Fecha del contrato**	20/03/2026
Presupuesto base (Io)	Enero 2026	**GG / utilidad**	10.00 % / 8.00 % · factor de relación 0.95

Montos del contrato

Concepto	Sin IGV (S/)	Con IGV (S/)
Monto contratado (contrato original)	476,308.07	562,043.52


2. Resumen de la valorización

Concepto	Detalle del cálculo	Monto (S/)
Costo directo valorizado		80,764.14
Gastos generales	10.00 % del costo directo	8,076.41
Utilidad	8.00 % del costo directo	6,461.13
(A) VALORIZACIÓN BRUTA	(CD + GG + U) × factor de relación 0.95	**90,536.60**
(B) Reajuste por fórmula polinómica	V × (K − 1); K = 1.034	3,078.24
(B2) Ajuste por atraso (D.S. 011-79-VC art. 7-B)	Reajuste acumulado: ejecutado 7,008.21, programado 8,611.65 → reconocido 7,008.21	0.00
(C) Deducción de reajuste por adelantos en efectivo	Amortización × (Kr / Ka − 1)	-52.84
(D) Deducción por adelanto de materiales	A × (Imr − Ima) / Imo	-231.12
VALORIZACIÓN REAJUSTADA		**93,330.88**
(F) Amortización del adelanto directo		-9,053.66
(G) Amortización del adelanto de materiales		-11,436.44
VALORIZACIÓN NETA (sin IGV)		**72,840.78**
IGV	18 %	13,111.34
TOTAL A FACTURAR		**85,952.12**

VERSIÓN DE EVALUACIÓN — ValorizacionesALF

3. Avance de obra y curva S

Indicador	Valor
Valorizado acumulado (sin IGV)	S/ 218,973.06
Contrato vigente (sin IGV)	S/ 476,308.07
Avance físico del mes	19.01 %
Avance físico acumulado	45.97 %
Programado acumulado (costo directo)	S/ 237,941.59
Ejecutado / programado acumulado	82.09 %

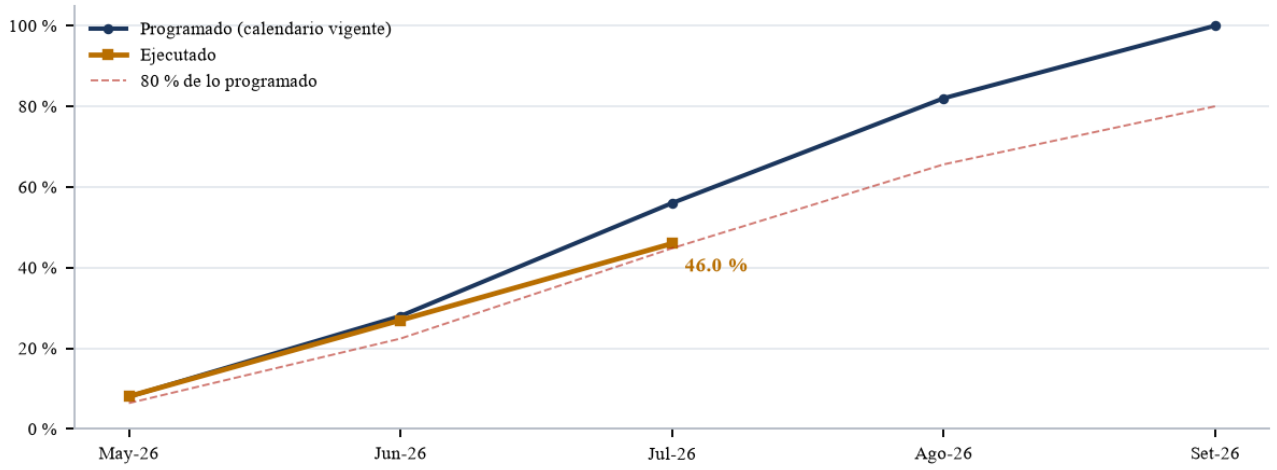

Curva S: avance acumulado programado (calendario vigente) frente al ejecutado, en porcentaje del costo directo del contrato.

4. Reajuste por fórmula polinómica

Fórmula	Subpresupuestos	V (sin IGV)	Ir (mes)	K	Reajuste V×(K−1)	Deducción adelantos
Fórmula polinómica – Edificaciones	Presupuesto principal	90,536.60	Ago-26	1.034	3,078.24	52.84
TOTAL		**90,536.60**			**3,078.24**	**52.84**

Fórmula polinómica – Edificaciones · área geográfica 2 (13 áreas)

Monomio	Coef.	Índice	Peso	Io (Ene-26)	Ir (Ago-26)	Ir / Io	Valor
J	0.392	47	1.000	101.35	101.35	1.0000	0.392
M	0.118	03	1.000	99.69	98.76	0.9907	0.117
C	0.124	21	1.000	100.55	104.50	1.0393	0.129
A	0.086	05	0.550	100.67	108.56	1.0784	0.097
		04	0.450	100.01	119.46	1.1945	
L	0.062	17	1.000	100.64	122.01	1.2123	0.075
E	0.058	49	1.000	101.15	101.79	1.0063	0.058
GU	0.160	39	1.000	100.12	103.87	1.0375	0.166
						K =	**1.034**

Base legal: D.S. N.° 011-79-VC y modificatorias, arts. 2, 3, 4 y 7; Reglamento Ley 32069, art. 209. Cada monomio se redondea al milésimo.

VERSIÓN DE EVALUACIÓN – ValorizacionesALF

5. Control del reajuste por atraso (art. 7-B)

Val.	Periodo	Reajuste programado	Reajuste ejecutado	Programado acum.	Ejecutado acum.	Reconocido acum.	Ajuste del mes
01	May-26	1,219.35	1,230.01	1,219.35	1,230.01	1,230.01	0.00
02	Jun-26	2,857.85	2,699.96	4,077.20	3,929.97	3,929.97	0.00
03	**Jul-26**	**4,534.45**	**3,078.24**	**8,611.65**	**7,008.21**	**7,008.21**	**0.00**

Regla (D.S. 011-79-VC, art. 7, rubro B): si la obra está o estuvo atrasada, el reajuste acumulado reconocido no supera el del avance programado acumulado según el calendario vigente; al recuperar el avance se devuelve lo retenido.
Calendario vigente: Calendario contractual

6. Adelantos y amortizaciones

Adelanto	Entrega	Monto	Amortizado anterior	Amortización actual	Saldo	Deducción de reajuste
Adelanto directo 10 %	Abr-26	47,630.81	12,843.65	9,053.66	25,733.50	52.84
Adelanto para cemento	May-26	38,000.00	16,223.89	11,436.44	10,339.67	231.12

Adelanto directo 10 %: 9,053.66 × (1.034 / 1.028 − 1)
Adelanto para cemento: 11,226.54 × (104.50 − 102.43) / 100.55

7. Observaciones

Sin observaciones.

Anguía, 30 de octubre de 2026

RESIDENTE DE OBRA
Ing. Residente de Ejemplo
Constructora Ejemplo S.A.C.

SUPERVISOR / INSPECTOR DE OBRA
Consorcio Supervisor Ejemplo
Municipalidad Provincial de Chota

VERSIÓN DE EVALUACIÓN – ValorizacionesALF

Anexo: valorización por partidas (costo directo)

			PRESUPUESTO CONTRATADO			ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO			SALDO	
Ítem	Descripción	Und.	Metrado	P.U.	Parcial	Metrado	Monto	Metrado	Monto	Metrado	Monto	%	Metrado	Monto
01	**OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES**				**11,515.00**		**11,515.00**		**0.00**		**11,515.00**			**0.00**
01.01	Cartel de identificación de obra 3.60 x 7.20 m	und	1.00	2,850.00	2,850.00	1.00	2,850.00	0.00	0.00	1.00	2,850.00	100.0 %	0.00	0.00
01.02	Almacén, oficina y caseta de guardianía	glb	1.00	6,500.00	6,500.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	1.00	6,500.00	100.0 %	0.00	0.00
01.03	Limpieza de terreno manual	m2	420.00	2.35	987.00	420.00	987.00	0.00	0.00	420.00	987.00	100.0 %	0.00	0.00
01.04	Trazo, nivelación y replanteo	m2	380.00	3.10	1,178.00	380.00	1,178.00	0.00	0.00	380.00	1,178.00	100.0 %	0.00	0.00
02	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**				**14,600.00**		**6,480.00**		**2,920.00**		**9,400.00**			**5,200.00**
02.01	Elaboración, implementación y administración del plan de SST	glb	1.00	8,200.00	8,200.00	0.40	3,280.00	**0.20**	**1,640.00**	0.60	4,920.00	60.0 %	0.40	3,280.00
02.02	Equipos de protección individual y colectiva	glb	1.00	6,400.00	6,400.00	0.50	3,200.00	**0.20**	**1,280.00**	0.70	4,480.00	70.0 %	0.30	1,920.00
03	**ESTRUCTURAS**				**216,271.19**		**96,578.12**		**63,028.14**		**159,606.26**			**56,664.93**
03.01	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**14,897.96**		**12,696.92**		**2,201.04**		**14,897.96**			**0.00**
03.01.01	Excavación de zanjas para cimientos h=1.20 m	m3	186.40	42.80	7,977.92	186.40	7,977.92	0.00	0.00	186.40	7,977.92	100.0 %	0.00	0.00
03.01.02	Relleno compactado con material propio	m3	74.20	38.50	2,856.70	40.00	1,540.00	**34.20**	**1,316.70**	74.20	2,856.70	100.0 %	0.00	0.00
03.01.03	Eliminación de material excedente D=5 km	m3	140.60	28.90	4,063.34	110.00	3,179.00	**30.60**	**884.34**	140.60	4,063.34	100.0 %	0.00	0.00
03.02	**CONCRETO SIMPLE**				**17,097.72**		**17,097.72**		**0.00**		**17,097.72**			**0.00**
03.02.01	Solado de concreto f'c=100 kg/cm2 e=4"	m2	132.50	31.20	4,134.00	132.50	4,134.00	0.00	0.00	132.50	4,134.00	100.0 %	0.00	0.00
03.02.02	Cimientos corridos C:H 1:10 + 30% P.G.	m3	48.30	268.40	12,963.72	48.30	12,963.72	0.00	0.00	48.30	12,963.72	100.0 %	0.00	0.00
03.03	**CONCRETO ARMADO**				**184,275.51**		**66,783.48**		**60,827.10**		**127,610.58**			**56,664.93**
03.03.01	Zapatas: concreto f'c=210 kg/cm2	m3	52.80	452.60	23,897.28	52.80	23,897.28	0.00	0.00	52.80	23,897.28	100.0 %	0.00	0.00
03.03.02	Zapatas: acero fy=4200 kg/cm2	kg	2,840.00	6.15	17,466.00	2,840.00	17,466.00	0.00	0.00	2,840.00	17,466.00	100.0 %	0.00	0.00
03.03.03	Columnas: concreto f'c=210 kg/cm2	m3	24.60	498.70	12,268.02	12.00	5,984.40	**12.60**	**6,283.62**	24.60	12,268.02	100.0 %	0.00	0.00
03.03.04	Columnas: encofrado y desencofrado	m2	236.20	62.40	14,738.88	104.50	6,520.80	**131.70**	**8,218.08**	236.20	14,738.88	100.0 %	0.00	0.00
03.03.05	Columnas: acero fy=4200 kg/cm2	kg	3,920.00	6.15	24,108.00	2,100.00	12,915.00	**1,820.00**	**11,193.00**	3,920.00	24,108.00	100.0 %	0.00	0.00
03.03.06	Vigas: concreto f'c=210 kg/cm2	m3	31.40	489.30	15,364.02	0.00	0.00	**18.00**	**8,807.40**	18.00	8,807.40	57.3 %	13.40	6,556.62
03.03.07	Vigas: encofrado y desencofrado	m2	268.50	68.90	18,499.65	0.00	0.00	**150.00**	**10,335.00**	150.00	10,335.00	55.9 %	118.50	8,164.65
03.03.08	Vigas: acero fy=4200 kg/cm2	kg	4,610.00	6.15	28,351.50	0.00	0.00	**2,600.00**	**15,990.00**	2,600.00	15,990.00	56.4 %	2,010.00	12,361.50
03.03.09	Losa aligerada: concreto f'c=210 kg/cm2	m3	38.70	476.80	18,452.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 %	38.70	18,452.16
03.03.10	Losa aligerada: ladrillo hueco 15x30x30 cm	und	2,650.00	4.20	11,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 %	2,650.00	11,130.00
04	**ARQUITECTURA**				**149,933.10**		**0.00**		**14,816.00**		**14,816.00**			**135,117.10**
04.01	Muro de ladrillo King Kong de soga, mezcla 1:4	m2	412.30	92.60	38,178.98	0.00	0.00	**160.00**	**14,816.00**	160.00	14,816.00	38.8 %	252.30	23,362.98
04.02	Tarrajeo de muros interiores, mezcla 1:5	m2	824.60	28.70	23,666.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 %	824.60	23,666.02
04.03	Tarrajeo de muros exteriores, mezcla 1:5	m2	386.20	34.10	13,169.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 %	386.20	13,169.42
04.04	Piso de cerámico 45x45 cm	m2	318.40	72.50	23,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 %	318.40	23,084.00
04.05	Pintura látex en muros (2 manos)	m2	1,210.80	14.60	17,677.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 %	1,210.80	17,677.68
04.06	Puertas de madera tornillo apanelada	und	8.00	1,180.00	9,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 %	8.00	9,440.00
04.07	Ventanas de aluminio con vidrio templado 6 mm	m2	64.20	385.00	24,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 %	64.20	24,717.00
05	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS**				**32,576.40**		**0.00**		**0.00**		**0.00**			**32,576.40**

			PRESUPUESTO CONTRATADO			ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO			SALDO	
Ítem	Descripción	Und.	Metrado	P.U.	Parcial	Metrado	Monto	Metrado	Monto	Metrado	Monto	%	Metrado	Monto
05.01	Salidas para centros de luz y tomacorrientes	pto	96.00	128.40	12,326.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 %	96.00	12,326.40
05.02	Tablero de distribución y alimentadores	glb	1.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 %	1.00	7,850.00
05.03	Red de agua fría y desagüe en SS.HH.	glb	1.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 %	1.00	12,400.00
	COSTO DIRECTO				**424,895.69**		**114,573.12**		**80,764.14**		**195,337.26**			**229,558.43**

Las columnas ACTUAL en negrita corresponden a las partidas valorizadas en el mes; en rojo, los acumulados con alerta (exceden el metrado contratado o vigente).

SESIÓN DE EVALUACIÓN – ValorizacionesALF
