Manual de InformeMensualALF 1.0

Línea ALF_BIM · ALF-10 · www.alfbim.com

InformeMensualALF arma el **informe mensual de obra** en Word y PDF, con formato de expediente y en Times New Roman. Junta en un solo documento:


- la **valorización del mes**, el avance físico y financiero, la curva S y los adelantos, desde **ValorizacionesALF** (archivo .alfv);
- el **plazo vigente**, las ampliaciones, el **cuaderno de obra del mes** y los trámites con sus vencimientos, desde **PlazosALF** (archivo .alfpo);
- el personal, los equipos, los materiales, el control de calidad, la seguridad, el clima y los problemas del mes;
- el **panel fotográfico** y los anexos (por ejemplo, el PDF de la valorización).

Si la obra no usa ValorizacionesALF ni PlazosALF, el avance y el plazo se ingresan a mano.

1. Primeros pasos

1. Instale con InformeMensualALF_Setup_1.0.0.exe. No pide permisos de administrador.
2. Abra **la obra de ejemplo** desde la pantalla de inicio. Tiene tres informes (mayo, junio y julio de 2026), con valorizaciones, plazos y fotos ilustrativas. Está en Documentos\InformeMensualALF\Ejemplos.
3. Para su obra: **Nueva obra** → elija el tipo de informe (residente, supervisión o inspector), vincule los archivos de ValorizacionesALF y PlazosALF (opcional) y el mes del primer informe.
4. **Guarde la obra** (Ctrl+S) en la carpeta de la obra. Junto al archivo .alfim se crea la carpeta <nombre>_archivos con las fotos, los logos y los anexos. Para llevar la obra a otra PC, copie las dos cosas (y los archivos .alfv y .alfpo).

2. Páginas del programa

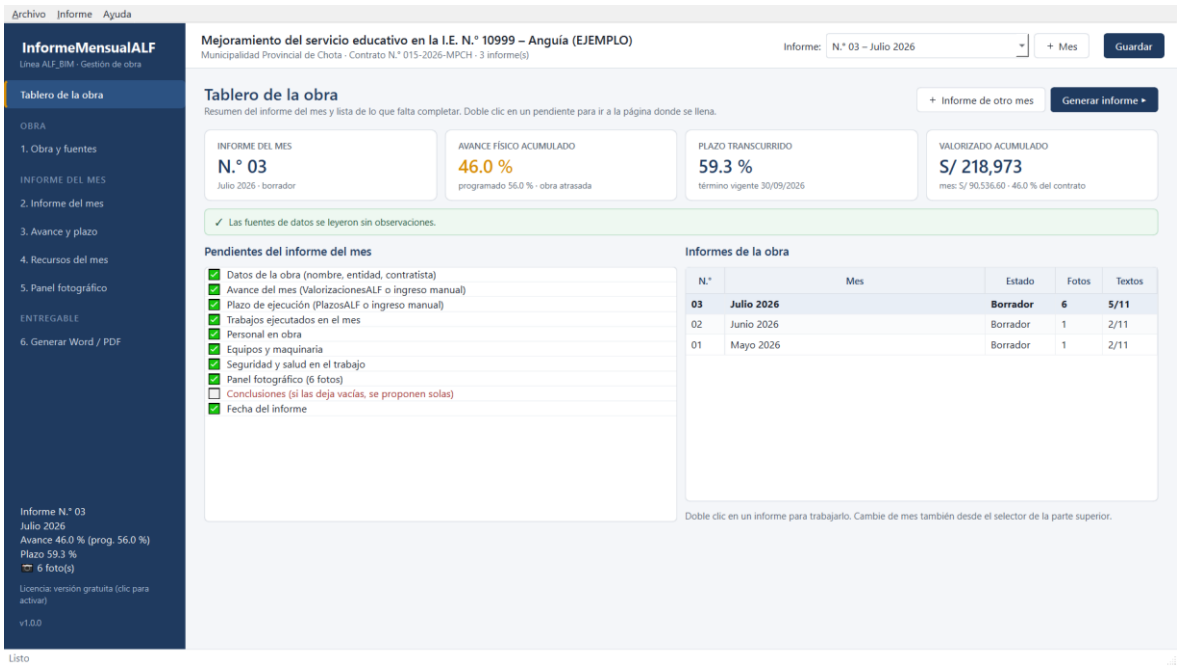


Tablero de la obra con la lista de pendientes del mes.

Página	Para qué sirve
Tablero de la obra	Indicadores del mes (avance, plazo, valorizado), avisos de las fuentes, lista de pendientes del informe y lista de informes. Doble clic en un pendiente lleva a la página donde se completa.
1. Obra y fuentes	Ficha de la obra, archivos vinculados, formato del documento (tipo de informe, lugar, fotos por página, carátula, índice), logos de la carátula y firmantes.
2. Informe del mes	Número, fecha, valorización que corresponde y estado, más los textos de cada sección.
3. Avance y plazo	Vista previa de lo que se toma de las fuentes y el ingreso manual (si no hay fuentes).
4. Recursos del mes	Personal, equipos, materiales, ensayos, problemas y soluciones, seguridad y clima.
5. Panel fotográfico	Fotos del mes: agregar, arrastrar, ordenar y describir.
6. Generar Word / PDF	Secciones, orden y títulos; anexos; exportación.

Arriba a la derecha está el **selector del informe** (mes) y el botón **+ Mes** para crear el informe de otro mes.

3. Fuentes de datos

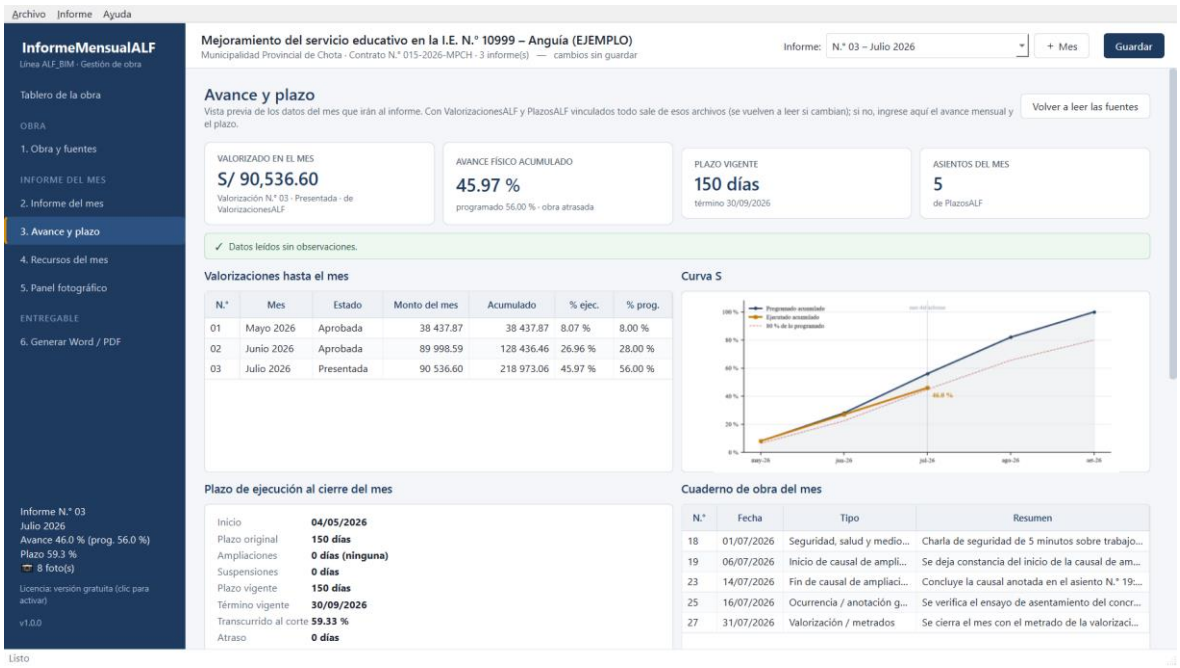

Avance y plazo: lo que se toma de ValorizacionesALF y PlazosALF.

ValorizacionesALF (.alfv)

Se toma la valorización **del mismo mes** del informe (o la que elija en «Informe del mes»):

- resumen de la valorización (CD, GG, utilidad, reajuste K, deducciones, amortizaciones, IGV, total a facturar);
- valorizado del mes, acumulado y saldo, avance físico y financiero;
- programado del mes y acumulado del **calendario vigente** y la relación ejecutado/programado;
- historial de valorizaciones y **curva S**;
- partidas con metrado en el mes (las de mayor monto si son muchas);
- adelantos, amortización del mes y saldo;
- observaciones de la supervisión.

Los cálculos los hace el mismo motor de ValorizacionesALF: el informe sale con las mismas cifras que el programa.

PlazosALF (.alfpo)

Se evalúa el control de plazos **a la fecha de corte** (último día del mes):

- plazo original, ampliaciones (incluidas las fictas), suspensiones, plazo y término vigentes, días transcurridos, atraso y penalidad;
- asientos del cuaderno de obra del mes;
- trámites con movimiento en el mes o en curso, y su próximo paso;
- vencimientos del mes y de los 30 días siguientes;
- modificaciones del contrato (ampliaciones, adicionales, suspensiones…).

Si edita el .alfv o el .alfpo con el programa abierto, InformeMensualALF lo vuelve a leer solo (o pulse **F5**).


Ingreso manual

En **Avance y plazo**:

- **Avance mensual:** un renglón por mes con el programado y el ejecutado (sin IGV). «Crear los meses del plazo» arma los meses desde el inicio y reparte el monto del contrato.

- **Plazo:** días de ampliación aprobados, detalle, días de suspensión y culminación. El inicio y el plazo original se toman de «Obra y fuentes».


4. El informe del mes

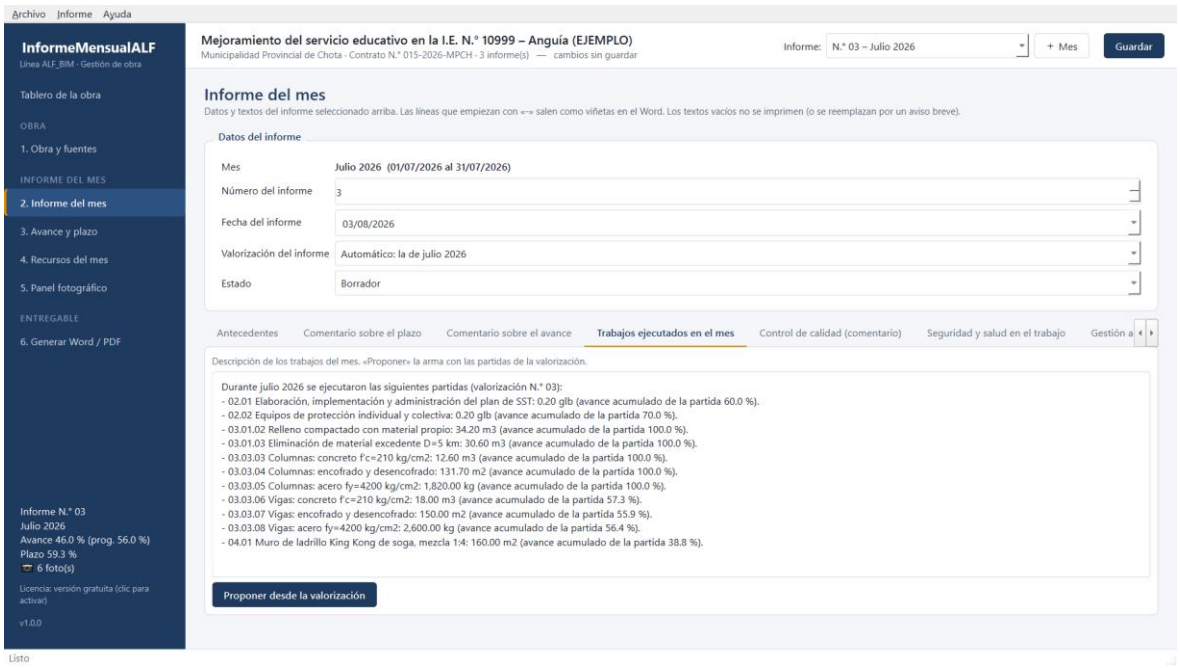

Trabajos del mes propuestos desde la valorización.

- **Copiar del mes anterior:** al crear el informe de un mes nuevo se copian los antecedentes, el personal, los equipos (con días y horas en cero) y los problemas en curso.
- **Textos:** una idea por línea; las líneas que empiezan con «-» salen como viñetas.
- **Proponer desde la valorización:** arma «Trabajos ejecutados» con las partidas del mes.
- **Proponer con los datos del mes:** arma conclusiones y recomendaciones con el avance, el plazo, los vencimientos, los problemas, la seguridad y los ensayos. Si deja vacías las conclusiones y las recomendaciones, el informe las propone solo.
- **Alerta del 80 %:** si la valorización acumulada ejecutada es menor al 80 % de la programada, el informe lo resalta y recuerda el calendario acelerado (Reglamento de la Ley N.° 32069, art. 207.1).


5. Panel fotográfico

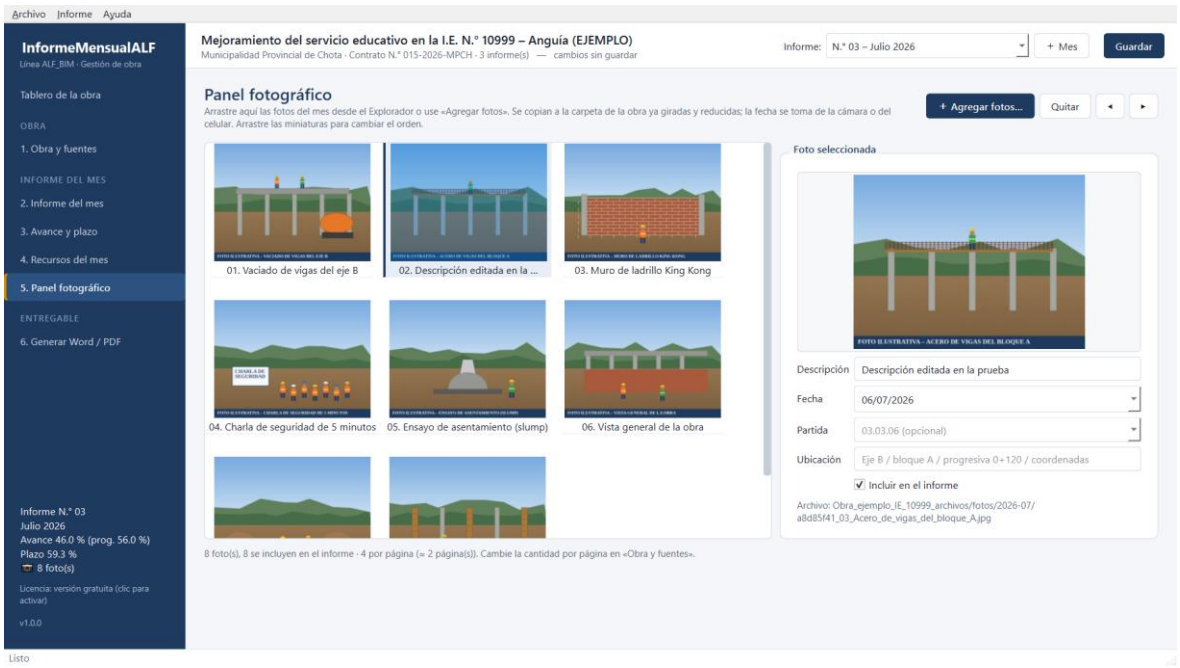

Panel fotográfico: miniaturas, orden y datos de cada foto.

- Arrastre las fotos desde el Explorador o use **Agregar fotos**. Se copian a la carpeta de la obra **giradas** según la cámara y **reducidas** a 1 800 px, para que el Word no pese demasiado.
- La **fecha** se toma de la cámara o del celular (EXIF) y, si la foto tiene GPS, las **coordenadas** van a «Ubicación».
- Escriba la descripción, la partida (puede elegirla de las partidas del mes) y la ubicación. Arrastre las miniaturas para ordenarlas.
- En «Obra y fuentes» elija 1, 2, 4 o 6 fotos por página.

6. Generar el Word o el PDF

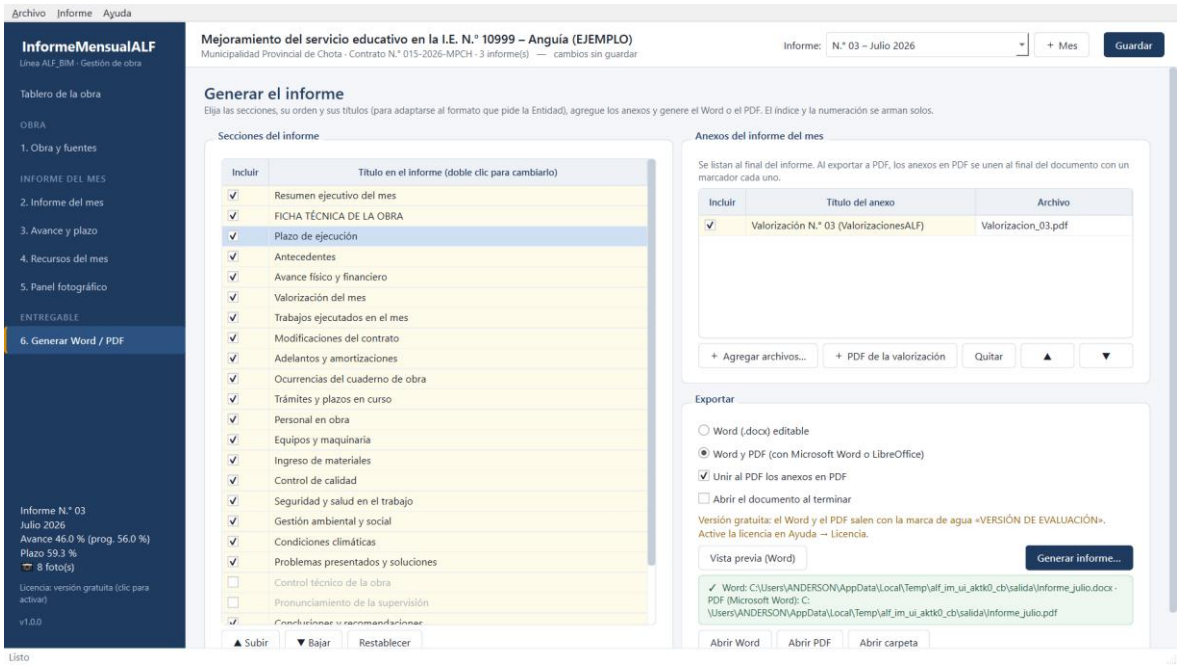

Secciones, anexos y exportación.

5. **Secciones:** marque las que van, cámbieles el orden con ▲ ▼ y, si la Entidad usa otros títulos, escríbalos (doble clic). «Restablecer» vuelve al formato estándar.

6. **Anexos:** agregue archivos (PDF, Excel, Word, imágenes) o **+ PDF de la valorización**, que genera el informe PDF de ValorizacionesALF del mes.
7. **Exportar:** Word, o Word y PDF.
    - Con **Microsoft Word**, el índice se actualiza solo y el PDF sale idéntico al Word, con marcadores.
    - Sin Word se usa **LibreOffice**, si está instalado.
    - Los anexos en PDF se unen al final del PDF, con un marcador cada uno.
8. **Vista previa (Word):** genera el documento en una carpeta temporal y lo abre.

El documento lleva carátula con logos, índice, secciones numeradas, tablas con formato de expediente, gráficos (curva S y avance contra plazo), firmas y el número de página «Página X de Y».

7. Licencia

- **Gratis:** todo el programa funciona, pero el Word y el PDF salen con la marca de agua «VERSIÓN DE EVALUACIÓN».
- **Con licencia:** salen limpios.
- Para activarla: Ayuda → Licencia, copie el **ID de equipo**, envíelo a ALF_BIM y pegue la clave que reciba. La licencia es por PC.

8. Preguntas frecuentes

- **El índice dice «haga clic derecho… Actualizar campo».** El Word se generó sin Microsoft Word. Ábralo en Word y pulse F9 (Word también lo ofrece al abrirlo), o exporte a PDF con Word.
- **No se encuentra el archivo .alfv o .alfpo.** Se movió de carpeta: vincúlelo de nuevo en «Obra y fuentes».
- **Falta una foto.** Se borró de la carpeta <obra>_archivos; el informe lo avisa al generarse.
- **El informe pesa mucho.** Use 4 o 6 fotos por página. Las fotos ya se reducen al importarlas.

Herramienta de apoyo: el contenido del informe debe ser revisado y firmado por el profesional responsable.
